


よつぎ小学校・四ツ木中学校 工事スケジュール (予定)

項目	令和6年度	令和7年度		令和8年度			令和9年度			令和10年度			令和11年度			令和12年度			令和13年度																																																								
	2025年			2026年			2027年			2028年			2029年			2030年			2031年																																																								
	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																								
工事ステップ	STEP1			STEP2			STEP3						STEP4			STEP5																																																											
変更 (週休2日制)	STEP1			STEP2			STEP3						STEP4			STEP5																																																											
1 プール解体・仮設校舎建設 変更なし	12か月			12か月																																																																							
2 既存校舎解体 変更 (週休2日制)																															6か月			8か月																																									
3 新校舎建設 変更 (週休2日制)																															24か月						33か月																																						
4 既存体育館・仮設校舎解体 変更 (週休2日制)																																		7か月						11か月																																			
5 外構整備 変更 (週休2日制)																																					6か月						12ヶ月																																

STEP1: プール解体・仮設校舎建設工事 STEP2: 既存校舎一部解体工事 STEP3: 新校舎建設工事 STEP4: 仮設校舎・既存体育館解体工事 STEP5: 外構・校庭整備工事

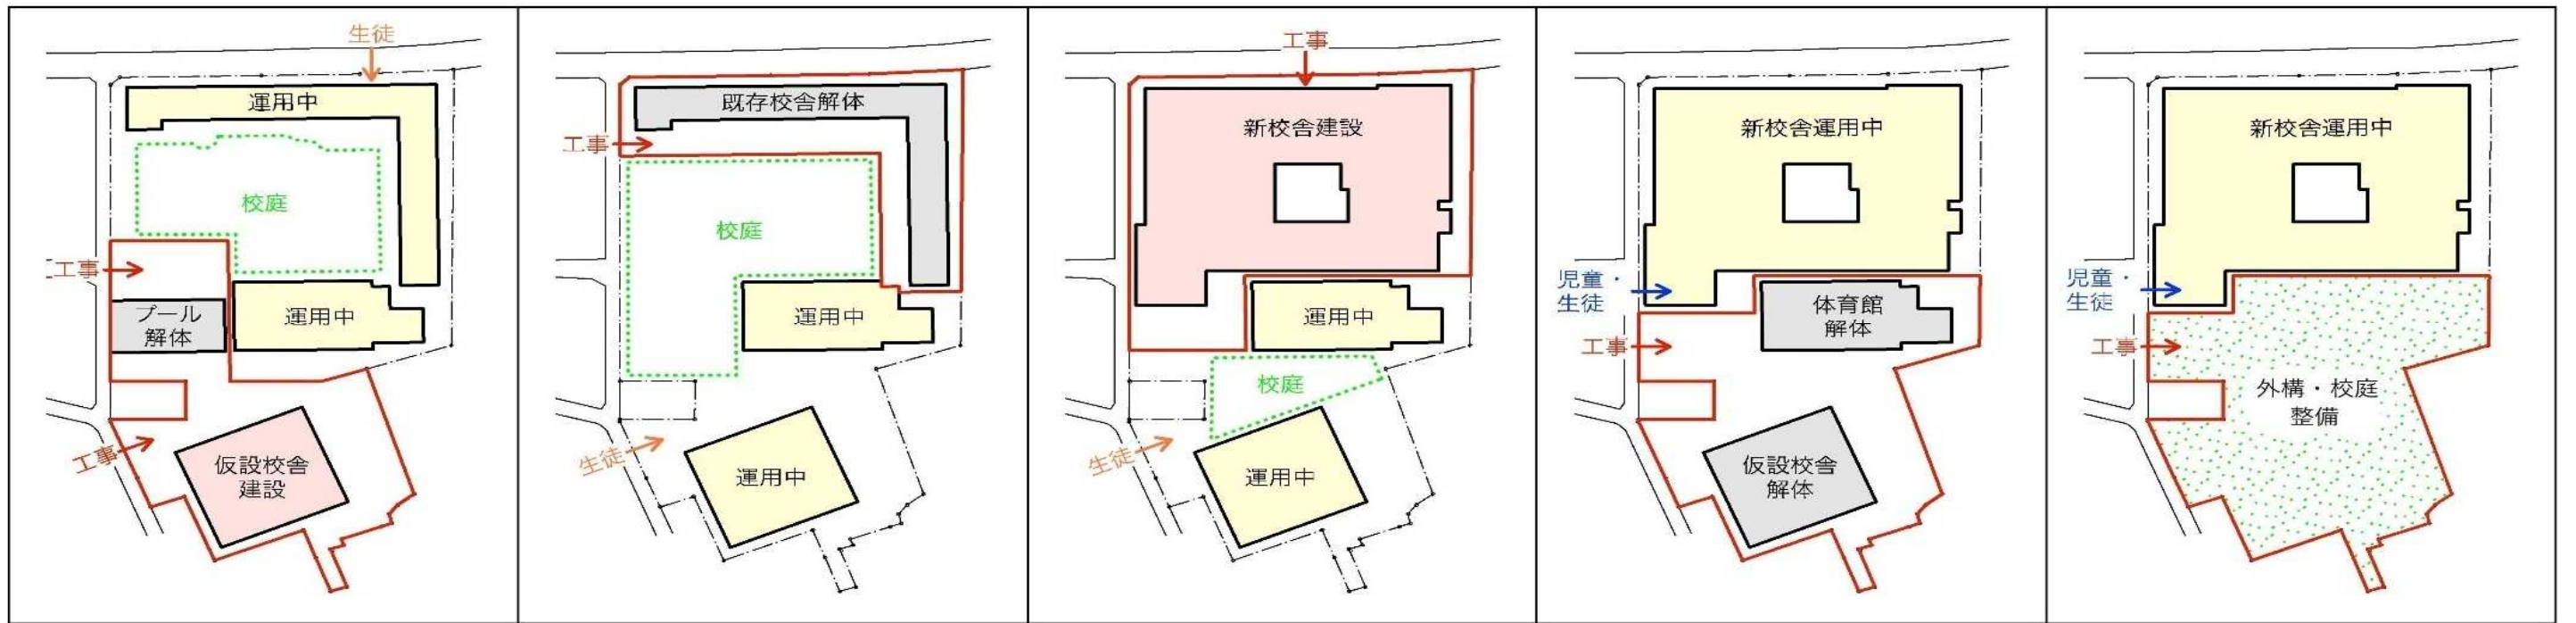

【凡例】 黄色 運用中 赤色 建設中 灰色 解体 赤線 工事エリア 点線 外構・校庭整備 赤矢 工事車両出入口 茶矢 生徒出入口 青矢 児童・生徒出入口
